

Bautagebuch Teil 2

Duschraum und Kabinenrenovierung FC Schönwald 1916

Tage 22 und 23

Am 7. Januar starteten wir die zweite Etappe der Renovierungsarbeiten. Horst und Mirko haben 125 qm Fliesen und 80 kg Fliesenkleber bei Baustoff Völker abgeholt.



Tage 24 und 25 der Renovierungsarbeiten

Trotz Wintereinbruch wurde am FC gearbeitet. Mirko hat die Duschaumwände gespachtelt. Horst hat die Bodenfliesen in der Gästekabine mit Kontaktschicht versehen.



Tage 26-28 der Renovierungsarbeiten

Nach der professionellen Abdichtung der Duschaumwände, wurden die Fliesenarbeiten am Dienstag gestartet. Unter Anleitung von Stefan, unserem ehrenamtlicher Helfer Nr. 26, geht es in der Dusche und in der Gästekabine gut voran. Auch Fiona und Julius waren eifrig dabei. Wir hätten noch Malerarbeiten zu vergeben. Decke Vorraum Kabinen und Eingangsbereich FC Heim. Holzwand Garderobe, Wände Eingangsbereich und Türzargen. Helfer bitte melden.



Tage 29 und 30

Fliesenarbeiten in Duschaum und Gästekabine.




Tage 31-32 der Renovierungsarbeiten

Im Duschaum wird die letzte Wand in Angriff genommen. Gästekabine ist ausgefugt. Nach letzten Streichausbesserungsarbeiten können Bänke montiert werden. Kabineneingang ist für das Fliesen grundiert. Morgen ab 14:30 Uhr bis Preisschafkopfbeginn Arbeitsdienst.



Tag 33 der Renovierungsarbeiten

Florian, unser Helfer Nr. 27 hat Dekorfliesen geliefert. Vorraum Kabinen wird gefliest.

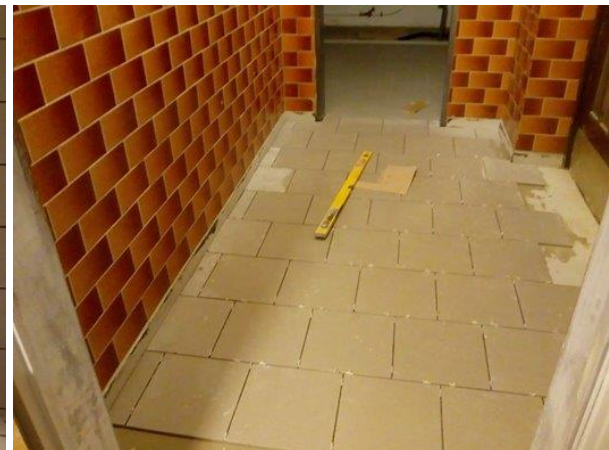

10. Woche der Renovierungsarbeiten (29.01. – 02.02.2019)

Wände in der Dusche sind fertig gefliest und ausgefugt. Flur Kabineneingänge ist gefliest. Timo und Julian haben die Streicharbeiten in der Gästekabine abgeschlossen. Mirko hat die Bodenlöcher für die Bänke in der Gästekabine gebohrt. In dieser Woche werden die Bänke montiert, Kabinenflur ausgefugt und das Fliesen des Duschebodens vorbereitet. Zudem können Malerarbeiten vergeben werden. Interessenten bitte melden.



11. Woche der Renovierungsarbeiten (04.02. -09.02.2019)

Duschraumboden und Heimkabine sind für das Fliesen vorbereitet. Arbeitsgeräte in die nahezu fertige Gästekabine umgeräumt. In der nächsten Woche wird nach der Abdichtung der Duscheboden und die Heimkabine gefliest. Außerdem stehen noch Malerarbeiten an. Von Montag bis Donnerstag ist die Baustelle ab 16:30 Uhr geöffnet.



Montag, 11.02.19

Die Renovierung schreitet weiter voran. Mirko hat die Abdichtung im Duschaum aufgebracht. Abends haben die Korlecks kräftig zugelangt. Jörg, Carlo und Timo haben neben Malerarbeiten einen Großteil der Heimkabine gefliest. Anschließend fand noch eine Arbeitssitzung statt, in der die noch ausstehenden Malerarbeiten und die Decke in der Dusche besprochen wurden. Morgen 16:00 Uhr geht es weiter.





Dienstag, 12.02.2019

Es geht weiter voran, Jürgen hat die Fliesen im Kabineneingang grundiert, Jörg, Carlo und Horst haben die Heimkabine fertig gefliest. Auch in der Dusche sind die Hälfte der Bodenfliesen verlegt. Marcel hat Aufräum- und Spachtelarbeiten durchgeführt. Ralf, unser ehrenamtlicher Helfer Nr. 28, hat Farben für den Fliesenanstrich geliefert. Da wir an den beiden Tagen sehr gut vorangekommen sind, bleibt am Mittwoch die Baustelle geschlossen. Am Donnerstag ab 15:30 Uhr geht es weiter.





Donnerstag, 14.02.2019

Jörg hat Decke und Fliesen im Kabinenvorraum gestrichen, Carlo und Horst die Schirikabine gefliest.

Jörg wird morgen das 2. Mal streichen.

Wegen des FC/TV-Faschings geht es erst nächste Woche weiter. Ab Mittwoch 15:30 Uhr sind folgende Abschlussarbeiten geplant:

Bodenfliesen ausfugen, Montage der Kabinenbänke in Heim- und Gästekabine. Weiterhin stehen noch Maler- und Lackierarbeiten an.

Wenn alles nach Plan verläuft könnten wir mit der Deckenmontage im Duschaum bis Ende Februar die Arbeiten beenden.



13. Woche der Renovierungsarbeiten (18.02- 23.02.2019)

Trotz Fasching, Skiurlaub und Erkrankungen, haben wir wieder einiges geschafft. Mirko hat den Duscheboden ausgefugt und mit dem Ausfugen der Heimkabine begonnen. Jörg hat die Malerarbeiten abgeschlossen. Carlo, Horst und unser ehrenamtlicher Helfer Nr. 29 Thomas, haben die Tuschetüren und die Bankuntergestelle in der Heimkabine angepasst. Außerdem wurden die ersten Türen fertiglackiert und durch Markus Ausbesserungsarbeiten in der

Heimkabine vorgenommen.

Nach dem Ausfugen und Anbohren könnten wir die Kabinenbänke montieren (Do/Fr).
Außerdem werden ab Montag 16:00 Uhr die restlichen Zargen und Türen lackiert.



14. Woche der Renovierungsarbeiten (25.02. – 02.03.2019)

Fliesen sind ausgefugt (Carlo, Mirko, Horst); Kabinenbänke gebohrt und montiert (Thomas Lang, Alex, Carlo, Horst); unser "Vereinschreiner" Egon hat die Türen gekürzt; Mirko die Baumaterialien für die Duschedecke besorgt; die Dampfsperre ist dran; Markus und Horst haben den Bauschutt entsorgt.

Wenn alles planmäßig verläuft und uns Ralf kräftig unterstützt, werden wir bis zum Wochenende die Renovierung abschließen.



15. Woche der Renovierungsarbeiten (04.03. – 09.03.2019)

Hauptarbeit war die Deckenmontage im Duschaum durch Ralf, Mirko, Jürgen und Horst. Die Decke ist gespachtelt, Heizungsrohre eingekoffert. Die Maler- und Lackierarbeiten wurden abgeschlossen. Das "Putzteam" hat erste Reinigungsarbeiten vorgenommen.

In der letzten Woche sind noch Ralf, Mirko und Klaus gefordert. Decke schleifen, grundieren und streichen, Silikonfugen spritzen, Duscharmaturen und Heizkörper montieren und die Elektroinstallation abschließen stehen noch aus.



16. Woche der Renovierungsarbeiten (11.03. – 16.03.2019)

Die Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen.

Ralf hat die Decke geschliffen, grundiert und Fertiganstrich aufgebracht. Mirko 55 m Silikonfugen gezogen. Nachdem Klaus am Freitag mit den Elektroarbeiten fertig war, haben Mirko und Dorian am Samstag Heizkörper, Waschbecken, Duschköpfe und Türen montiert. Außerdem wurden die Außentüren innen lackiert.

Vielen Dank allen Helfern!



