

Bautagebuch „Renovierungsarbeiten Dusche und Kabinen“

Teil1

November und Dezember 2018

Tag1 19.11.2018

Wie angekündigt, haben wir heute die Renovierungsarbeiten begonnen. Decke ist ab. Installateur Mirko hat Heizkörper und Armaturen demontiert. Mit dem Stahlzargenausbau und der Türverbreiterung und dem Abschlagen der Fliesen wurde begonnen. Morgen gehts weiter.



Tag 2 der Bauarbeiten nach Plan verlaufen.

Alte Zargen sind raus. Türöffnungen verbreitert, Sturz zum Austausch freigelegt. War heute eine richtige "Drecksarbeit". "Helfer" Jürgen hat 2/3 der Bodenfliesen entfernt.



Tag 3

Carlo stört den Bauablaufplan. Eigentlich sollte heute die Baustelle geschlossen bleiben. Aber nachdem sich Baufacharbeiter Carlo angemeldet hatte, gingen die Arbeiten weiter. Anschlüsse für neue Duscharmaturen sind freigelegt, Wandfliesen bis auf wenige Feinarbeiten abgeschlagen und der Bauschutt entsorgt. Somit sind die Abbrucharbeiten im Duschaum nahezu abgeschlossen. Unser Vereinselektriker Klaus, sowie Vereinsinstallateur Mirko sind nun am Zug.



Tag 4 Renovierungsarbeiten –

Klaus hat Elektrovorinstallation abgeschlossen. Fliesenbestellung ist erledigt. Mörtel und Putz wurden besorgt. Morgen und am Samstag wollen wir groß angreifen. Auf Jürgen warten noch 4 qm Bodenfliesen. In beiden Kabinen sind Bänke abzuschrauben und die Holzleisten und die Untergestelle zu schleifen. Randfliesen in den Kabinen müssen entfernt werden. Decken und Wände sind zum Streichen vorzubereiten. Wer kann einen Schmutzsauger zur Verfügung stellen. Außerdem bitte Akuschrauber mit Kreuzschlitzeinsätzen, Schraubenschlüssel 10-17, Spachtel und gute Laune mitbringen.

Bitte an C- und A-Jugend, 1. Mannschaft und alle die unterstützen können weitersagen.

Bis Morgen, die Baustelle ist ab 13:00 Uhr geöffnet.

Tag 5 und Tag 6 Renovierungsarbeiten

Mirko hat gestern Heizungsleitung verlegt, Carlo Türsturz gesetzt. Maxi, Simon und Timo haben die Kabinenbänke ausgebaut und vorgeschliffen. Super gearbeitet Jungs! Jürgen hat die restlichen Bodenfliesen entfernt.

Dann kam der Auftritt des "Herrn der Farben", unseres Vereinsmalemeisters Ralf Wolfermann. Zunächst wurde im Bereich der Duschen umgeplant. Alte Sinkkästen raus, Duschbecken erhöhen, Duschrinnen einbauen. Carlo und Markus griffen gleich zur Hilti, die Vorarbeiten sind fast abgeschlossen. Anschließend wurde die Farbgestaltung in den Kabinen besprochen. Die Vorarbeiten dazu sind gestartet.

Plan für Heute: Schleifarbeiten an Kabinenbänken, Türzargen einbauen, Wände für das Streichen vorbereiten, Randfliesen in den Kabinen beseitigen. Bauschutt entsorgen. Wir bräuchten dringend Band und Schwingschleifer mit Schleifband 120er.



Tag7

Neue Männer auf der Baustelle, Thomas, Dorian und Marcel haben kräftig zugelangt.



Wir greifen wieder an!

Woche 2 der Renovierungsarbeiten

- Planung-

Mo ab 13 Uhr - Schleifarbeiten an Kabinenbänken, Spachtelarbeiten Gäste- und Schirikabine, Heimkabine ausräumen;

Di ab 14 Uhr - 20 Uhr - Lackierarbeiten Kabinenbänke und evtl. Heimkabine, Streichen Schiedsrichterkabine, Decke Gästekabine;

Mi ab 13 Uhr Streicharbeiten

Do ab 13 Uhr -falls Abfüsse durch Mirko gesetzt sind - Ausgleichsschüttung,
Perimeterdämmung in Dusche, Streicharbeiten

Fr ab 13 Uhr - Estrich in Dusche einbringen

Sa - kein Arbeitsdienst wegen Hallenturnier und Adventszauber

Wir hoffen auf viele Helfer!

Das Bauteam

Tag 8

FC-Urgestein Alex, der 14. FCler, der die Renovierungsarbeiten unterstützt.



Tag 9

Das Baustofflager ist prall gefüllt. Wir suchen "Spachtler", Verputzer, Estrichleger, Maler und Lackierer. Heute um 16:00 geht es weiter.



Tag 10

Philip Gassenmeyer, unser 15. ehrenamtlicher Helfer, hat die Lackierarbeiten gestartet. Saubere Arbeit Philip. Morgen wieder Abendschicht ab 16:00 Uhr mit Carlo.



Tag 11

Die Pessimisten "eines Besseren belehrt".

Heute 8 FCler auf der Baustelle. Marc Schuster Nr. 16 der ehrenamtlichen Helfer. Wer gedacht hat, beim FC kann keine größere Baumaßnahme gelingen, dem wurde heute bewiesen, dass was geht.

Toller Einsatz der Jungs der 1. Mannschaft und unseres Baufacharbeiters Carlo.

Morgen ab 13 Uhr beschließen wir die 2. Woche der Renovierungsarbeiten. Wer ist der 17. ?



Tag 12


Die beiden hatten nur zum Foto die Hände in der Tasche. Simon hat Füße der Bänke fertiglackiert. Alex Leisten grundiert und Horst Zargen gesetzt. Montag 13 Uhr geht es weiter.



Tag 13 der Renovierungsarbeiten

Jürgen hat nach dem Anschleifen die restlichen Bankleisten grundiert und die ersten Leisten endlackiert. Zudem wurden Zargen hinterfüllt und der Rahmen der Wasseranschlussgrube entfernt. Morgen gehts um 14:00 Uhr weiter. Verputz- und Spachtelarbeiten, Lackieren der Bankleisten und Installation der Duscharmaturen steht auf dem Plan.

Wer wird die Nr. 17?

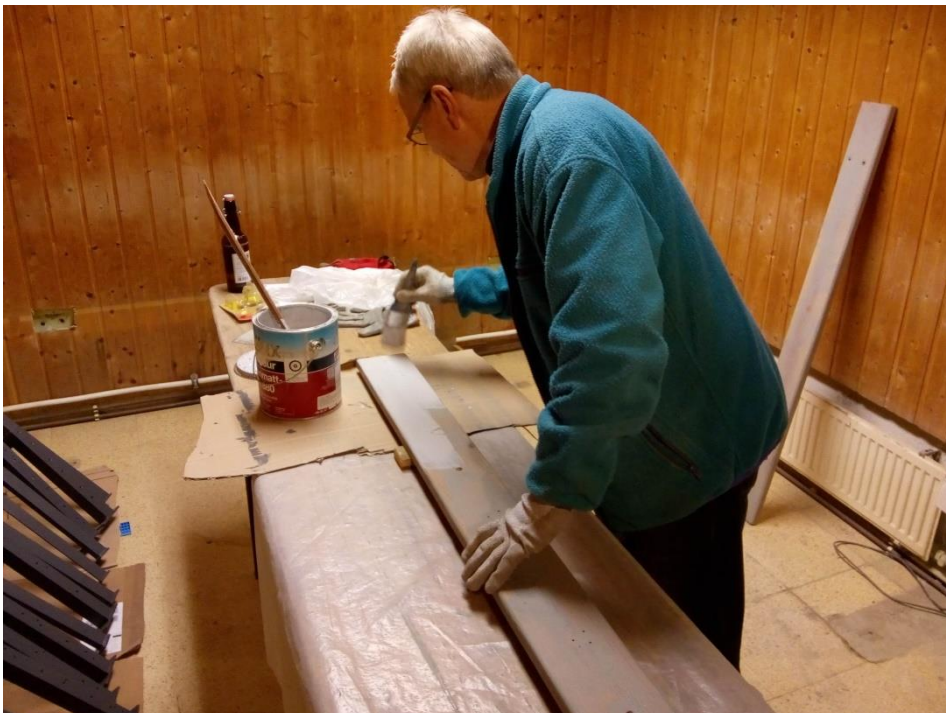

Tag 14 - Renovierungsarbeiten

Michael und Jeremy , die ehrenamtlichen Helfer Nr. 17 und 18. Mit Jürgen, Carlo, Thomas, Mirko und Horst waren heute wieder 6 Mann auf der Baustelle. Bankleisten sind lackiert, Verputzarbeiten zum Großteil erledigt und neue Duscharmaturen gesetzt.

Morgen um 14:30 Uhr beginnen wir mit den Malerarbeiten.

Donnerstag ist die Baustelle wegen Nikolaus geschlossen.

Am Freitag und Samstag greifen wir wieder an.



Tag 15 der Renovierungsarbeiten

Heute Fröhschicht wegen Nikolaus

Danke Egon Habiger, unserem Helfer Nr. 19, der die Holzverkleidung in der Heimkabine wieder fachmännisch ergänzt hat. Außerdem wurden an den Tür- und Fensterrahmen Leisten angebracht. Simon hat trotz gebrochener Hand die ersten Zargen lackiert !!! Die Abmauerung für die Ablage in der Dusche ist ebenfalls fertig.

Freitag ab 13:00 Uhr und Samstag ab 9:00 Uhr wollen wir die Malerarbeiten zum Abschluss bringen. Wir hoffen auf zahlreiche Helfer.



Tag 16 der Renovierungsarbeiten

Mit 13 Mann Rekordbeteiligung

A-Junioren mit Julian, Lukas, Nico, Tim (Nr. 20 -23 der ehrenamtlichen Helfer) und Jeremy stark vertreten.

Unser Malervorarbeiter Jörg (Nr. 24) hat die Richtung für die Malerarbeiten vorgegeben und natürlich kräftig zugelangt. Zum wiederholten Male haben auch Carlo, Timo, Marcel, Alexander und Simon die Arbeiten unterstützt. Klaus hat bereits vormittags die Lampe demontiert und Baustellenbeleuchtung montiert. Mit einem Dämmerstopp im Turnerheim ließen wir den Arbeitstag ausklingen.

Morgen ab 9:00 Uhr gehts weiter.





Tag 17 Renovierung Duschaum Kabinen

Julian hat die Türen für das Lackieren vorbereitet. Andreas , Helfer Nr. 25, Markus, Jörg und Horst haben die beiden Kabinen gestrichen. Unser Elektromeister Klaus hat Lüfter und neue Beleuchtung vorinstalliert.

Nächste Woche ist der zweite Anstrich Schiedsrichter- und Gästekabine geplant. Die 4 Türen und 6 Zargen können lackiert werden. Nach der Fliesenlieferung beginnen wir in der Gästekabine mit dem Fliesen.

Mit unserem Maler Jörg starten wir am Montag um 9:30 Uhr in die 4. Woche der Renovierungsarbeiten. Nachmittags- und Abendschichtler bitte bei Alex, Simon oder Horst melden.



Tage 18 und 19 der Renovierung Dusche/Kabinen

Jörg hat am Montag in der Frühschicht die Schirikabine das zweite Mal gestrichen. Heute waren unsere Lackierer im Einsatz. Jürgen hat die Heizkörper gereinigt, angeschliffen und lackiert, Alex hat noch ein paar Schönheitsreparaturen vorgenommen und Thomas den Garderobeleisten den letzten Anstrich verpasst.

Morgen ab 16:00 Fliesenreinigung zur Vorbereitung der Grundierung, Türblätter und Zargen lackieren. Garderobenleisten montieren.



Tage 20 und 21 der Renovierungsarbeiten

Gestern war Alex im Einsatz, heute kamen noch die Langs dazu. Garderobenleisten sind montiert, Rost an Türzargen entfernt, Türen vorlackiert. Mirko hat die Kernbohrung für die Entlüftung hergestellt. Das Entlüftungsrohr ist eingeschäumt. Außerdem wurden die Fliesen für das Grundieren vorbereitet.

Da die Fliesen frühestens am Freitag nächster Woche geliefert werden, bleibt die Baustelle bis auf weiteres geschlossen.

Das Bauteam wünscht noch stressfreie Adventstage und ein frohes Fest. Nach den Weihnachtsfeiertagen melden wir und wieder.

